



IMT Staphorst B.V.
Rijksweg 2a
7951 DH Staphorst
0522 – 247328
www.imtstaphorst.nl



Aan de eigenaar/bewoner(s) van dit adres

Datum: 19-4-2024
Betreft: Informatiebrief P123 Gedempte Heve te Genemuiden


Beste meneer, mevrouw,

Middels deze brief willen wij u informeren over de voortgang van ons werk. Eind deze week is de Drostenhofstraat gereed. We zijn nu bezig met het bestraten van deze weg. Komende week gaan we verder met het aanleggen van het riool in 't Dijkje voor de garageboxen langs.

In de week van 29 april starten we in opdracht van gemeente Zwartewaterland met het herstraten van 't Dijkje. Het werk betreft het verwijderen van de bestrating en weer opnieuw aanbrengen van de bestrating in de rijbaan en rabatstrook. De werkzaamheden lopen tot nu toe niet helemaal volgens planning, onder meer door slechte weersomstandigheden. Omdat vertraging is ontstaan op de planning willen we dit inhalen door, de eerder gecommuniceerde fase 6, 't Dijkje naar voren te halen in de planning, zie Figuur1: Faseringsplan. Dat betekent o.a. dat fase 6 een 3 weken eerder gaat starten.

Door de werkzaamheden van de Nutsbedrijven op de Achterweg moest bijna de gehele verharding verwijderd worden. De Achterweg stond pas in fase 7 (juni) op de planning. We kunnen de aanwonenden niet zo lang laten wachten op een herstel van deze straat. Daarom worden de werkzaamheden naar voren gehaald, nu fase 7a, in de planning en zijn we nu volop bezig met het straatwerk. Het deel 7a van deze fase zal gereed zijn op vrijdag 10 mei.

Fase 1 Westerkaai	gereed
Fase 2 Drostenhofstraat	vrijdag 19 april gereed
Fase 3: Dijke – Ged. Heve	maandag 18 maart t/m vrijdag 3 mei (week 12 t/m week 18)
Fase 4: P Gedempte Heve	maandag 27 mei t/m vrijdag 7 juni (week 22 t/m week 23)
Fase 5: Gedempte Heve	maandag 3 juni t/m vrijdag 12 juli (week 23 t/m week 28)
Fase 6: 't Dijkje	maandag 29 april t/m vrijdag 31 mei (week 18 t/m week 22)
Fase 7a: Blokhuisweg	maandag 8 april t/m vrijdag 10 mei (week 15 t/m week 19)
Fase 7b: Blokhuisweg	maandag 8 juli t/m vrijdag 19 juli (week 28 t/m week 29)

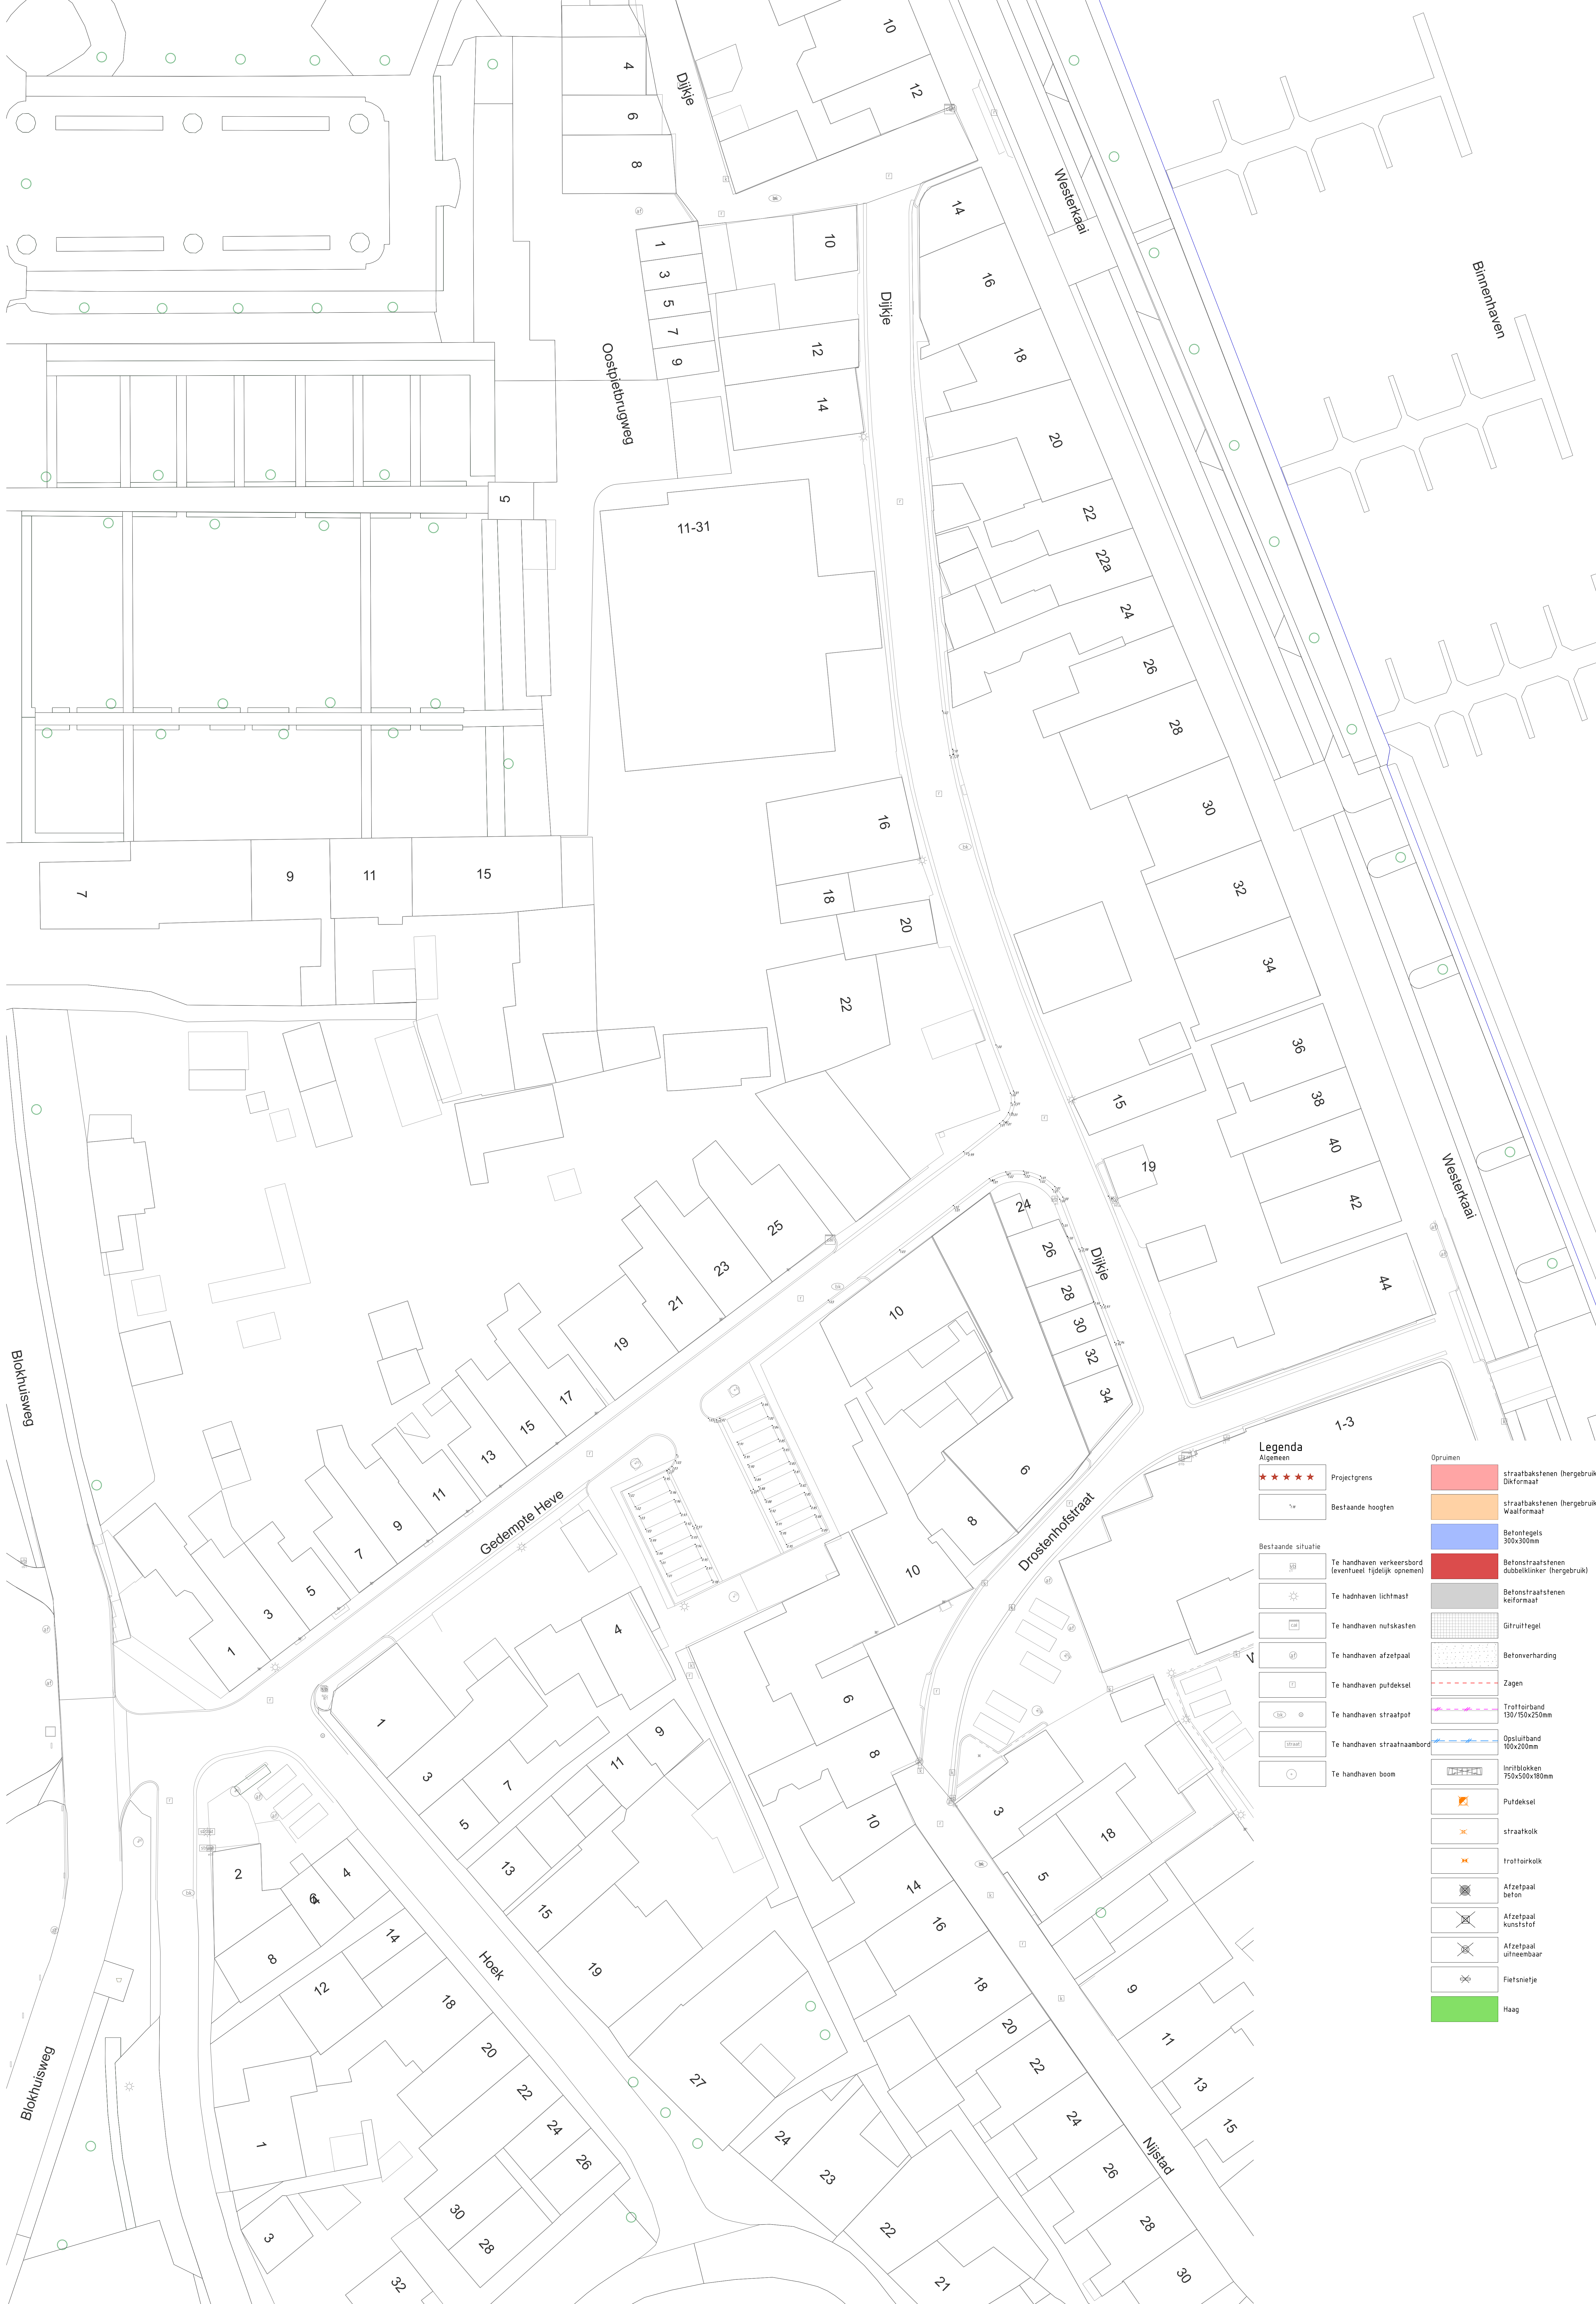

Legenda

Algemeen

- ★ ★ ★ ★ Projectgrens
- 1m Bestaande hoogten

Bestaande situatie

- Te handhaven verkeersbord (eventueel tijdelijk opheffen)
- Te handhaven lichtmast
- Te handhaven nutskasten
- Te handhaven afzetpaal
- Te handhaven putdeksel
- Te handhaven straatpot
- Te handhaven straatnaambord
- Te handhaven boom

Opruimen

- straatbakstenen (hergebruik) Dikformaat
- straatbakstenen (hergebruik) Waalformaat
- Betontegels 300x300mm
- Betonstraatstenen dubbelklinker (hergebruik)
- Betonstraatstenen keifformaat
- Gitrulitegel
- Betonverharding
- Zagen
- Trottoirband 130/150x250mm
- Opsluitband 100x200mm
- Inrijblokken 750x500x180mm
- Putdeksel
- straatkolk
- trottoirkolk
- Afzetpaal beton
- Afzetpaal kunststof
- Afzetpaal uitneembaar
- Fietsnietje
- Haag



We vragen uw begrip

De werkzaamheden kunnen tot enige overlast leiden. Echter voor een vlotte uitvoering is uw medewerking onmisbaar. Wij vragen u daarom om de rijbaan vrij te houden, eventuele wegafzettingen intact te laten en auto's buiten de afzetting te parkeren. De garages en andere gebouwen zijn op het moment van de werkzaamheden niet bereikbaar met de auto.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

We proberen de overlast tot een minimum te beperken. Maar als u toch onoverkomelijke problemen ondervindt door de werkzaamheden, bel dan gerust met uitvoerder de heer Albert Dunnink. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 57 48 45 47. Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met Bert Roeten, projectleider gemeente Zwartewaterland, bereikbaar via bert.roeten@zwartewaterland.nl of telefoonnummer 14 038.



www.zwartewaterlandinzicht.nl/projecten/gedempte-heve-83.nl

Op deze website kunt u informatie vinden o.a. over het project Gedempte Heve. Scan de QR – code die u hiernaast ziet om direct naar de pagina te gaan.

Met vriendelijke groet,

IMT Staphorst
